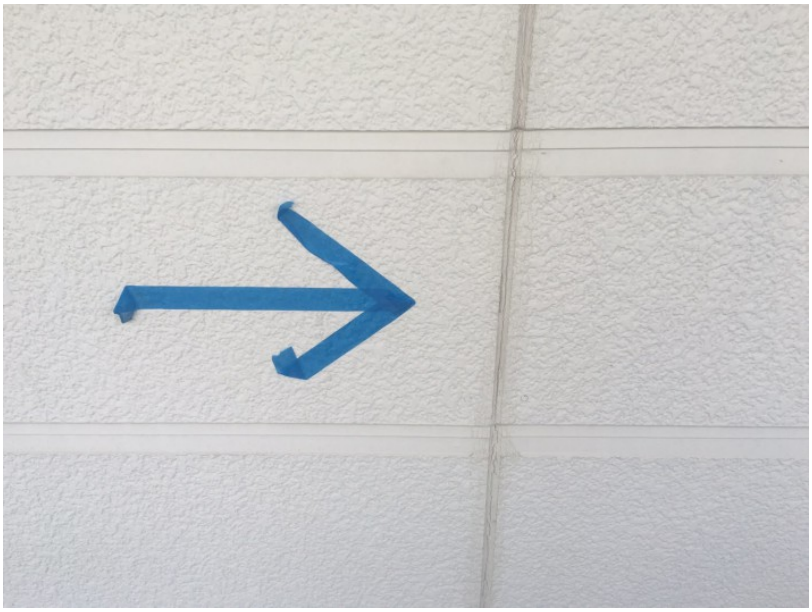
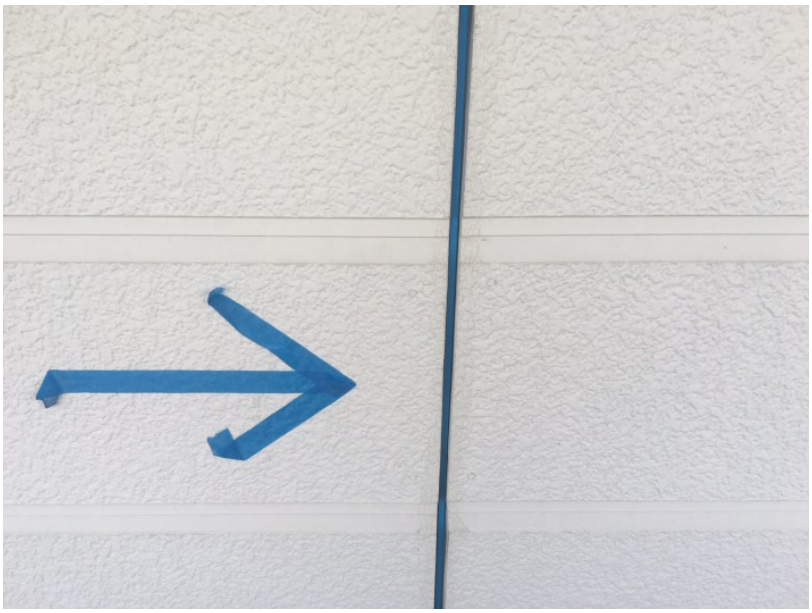
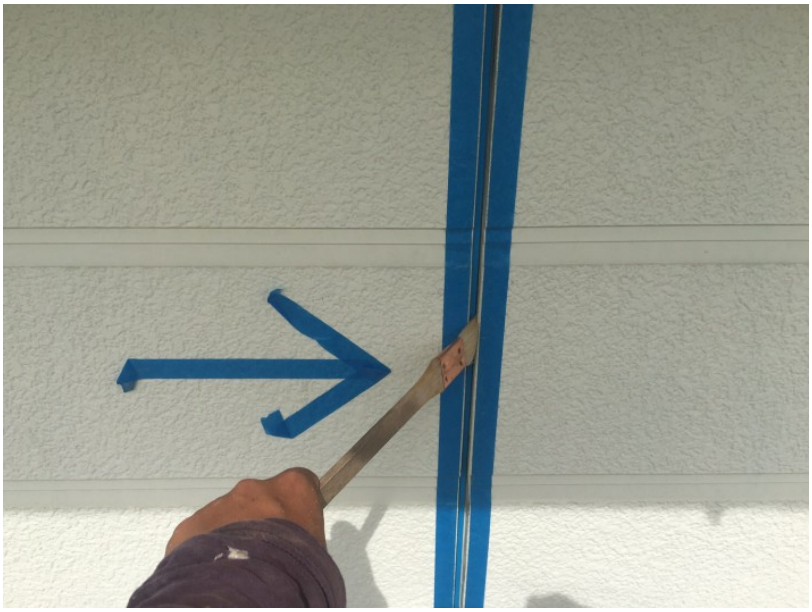
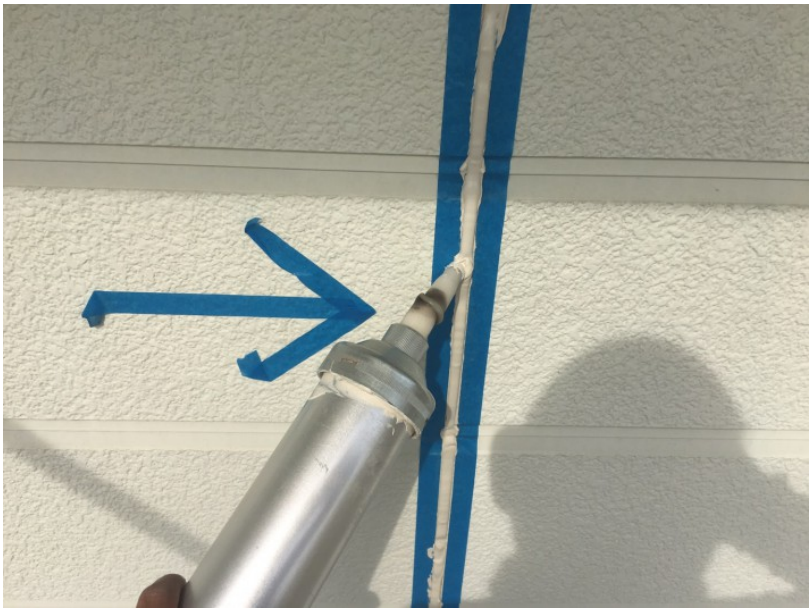
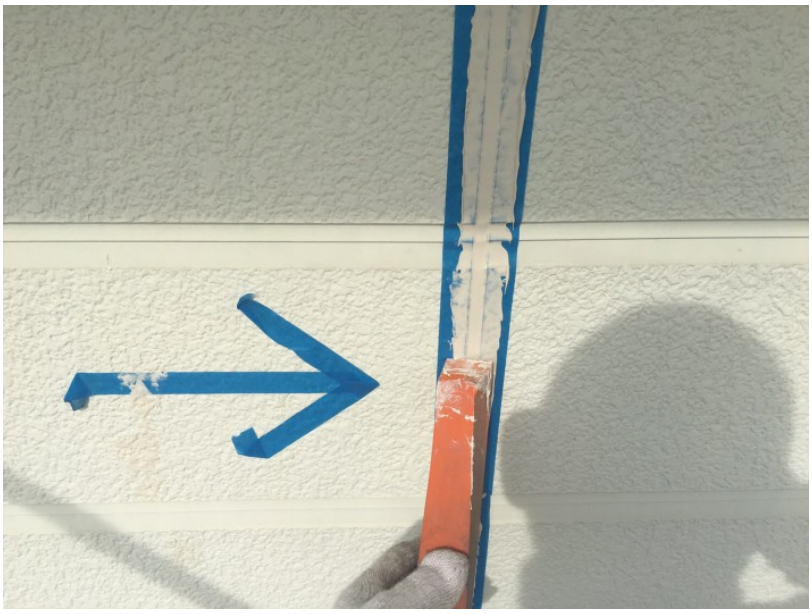
	施工箇所：全体 施工前
	施工箇所：全体 施工前
	施工箇所：全体 足場組


	施工箇所：全体 足場組
	施工箇所：全体 足場組完了
	施工箇所：屋根 高圧洗浄 ホコリ・苔・カビ等、長年の汚れを120～150kgf・/㎡の高圧洗浄機で洗い流します。

	施工箇所：屋根 高圧洗浄
	施工箇所：外壁 高圧洗浄
	施工箇所：外壁 高圧洗浄

	施工箇所：目地 施工前
	施工箇所：窓廻り 施工前 窓廻り部分は劣化少なく動きも少ないため為、既存シーリングの上からの打ち増しです。
	施工箇所：目地 既存シーリング撤去 外壁目地部分は、亀裂・断裂した既存シーリングを撤去し打ち替えです。

	既存シーリング撤去材
	施工箇所：目地 シーリングプライマー シーリングの密着性を良くする為の作業です。 この作業を怠ると、サイディングとシーリングの間にすぐに隙間が空いてしまいます。
	施工箇所：窓廻り シーリングプライマー

	施工箇所：目地 シーリング充填 空気が入らない様に慎重にたっぷりと打ち込みます。 空気が入るとあとから膨張してシーリングが破裂します。
	施工箇所：窓廻り シーリング充填 塗膜が割れても目立たない様に外壁色と共色で施工しています。
	施工箇所：目地 シーリング均し 規定量の厚み確を確保し綺麗に均します。 ただ均すだけでなく，内部に空洞ができないように最低１往復，押さえ込むようにします。

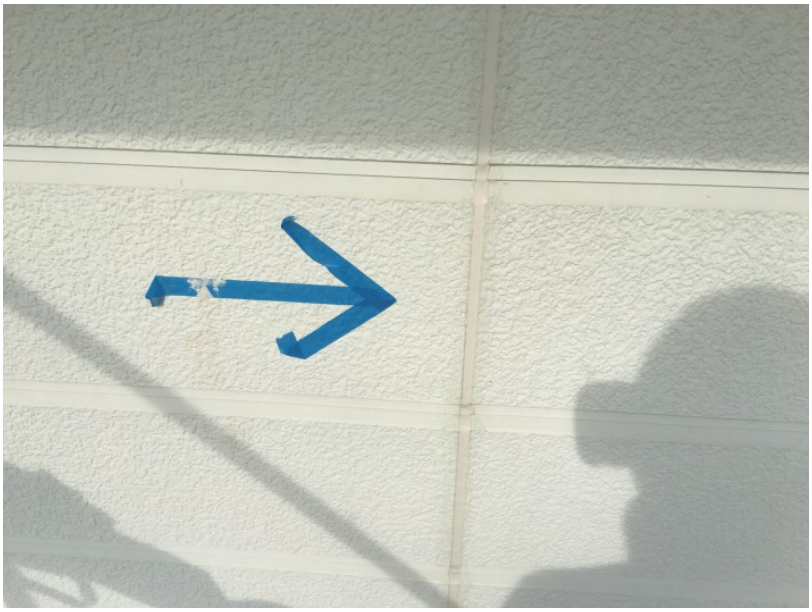	施工箇所：窓廻り シーリング均し
	施工箇所：目地 シーリング施工後
	施工箇所：窓廻り シーリング施工後

	施工箇所：大屋根 プライマー 密着性を良くするための作業です。簡単に説明するとボンドのような役割です。
	施工箇所：下屋根 プライマー
	施工箇所：大屋根 中塗り 上塗り材の補強や平滑な下地を作り、塗膜の厚みを確保します。

	施工箇所：下屋根 中塗り
	施工箇所：大屋根 上塗り 塗り残しや、塗りムラを無くし 美観性と耐候性を高めます。
	施工箇所：下屋根 上塗り

	施工箇所：大屋根 施工後
	施工箇所：下屋根 施工後
	施工箇所：軒天 下塗り



	施工箇所：軒天 上塗り
	施工箇所：軒天 施工後
	施工箇所：外壁 下塗り 密着性を良くするための作業です。簡単に説明するとボンドのような役割です。

	施工箇所：外壁 下塗り
	施工箇所：外壁 中塗り 上塗り材の補強や平滑な下地を作り、塗膜の厚みを確保します。
	施工箇所：外壁 中塗り

	施工箇所：外壁 上塗り 塗り残しや、塗りムラを無くし 美観性と耐候性を高めます。
	施工箇所：外壁 上塗り
	施工箇所：外壁 施工後

	施工箇所：外壁 施工後
	施工箇所：小庇 錆止め 密着性を良くし、金属の腐食を防ぐ効果があります。
	施工箇所：小庇 中塗り

	施工箇所：小庇 上塗り
	施工箇所：小庇 施工後
	施工箇所：瓦棒屋根 錆止め

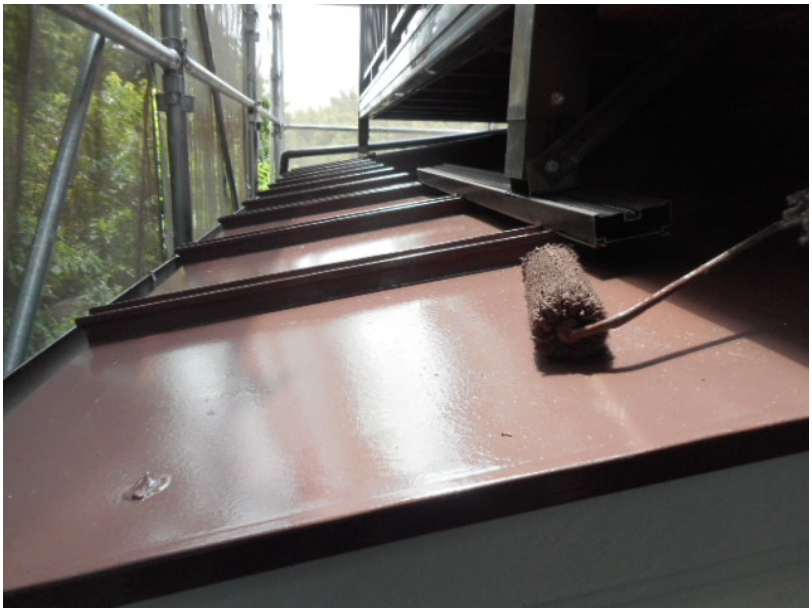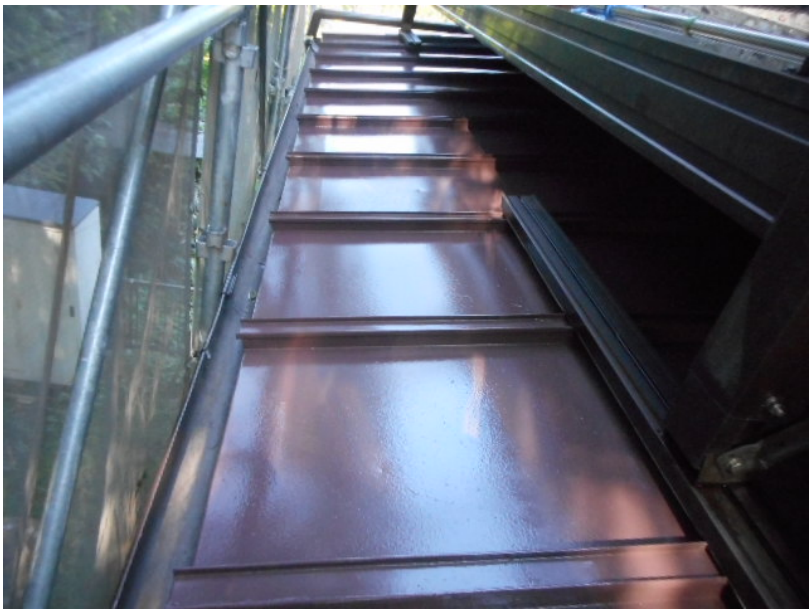	施工箇所：瓦棒屋根 中塗り
	施工箇所：瓦棒屋根 上塗り
	施工箇所：瓦棒屋根 施工後

	施工箇所：破風 下塗り
	施工箇所：破風 上塗り
	施工箇所：破風 施工後

	施工箇所：雨樋 下塗り
	施工箇所：雨樋 上塗り
	施工箇所：雨樋 施工後

	施工箇所：雨戸 ケレン 汚れや錆を落としたり、表面に凹凸をつけることによって、接触面積を大きくし密着性を良くします。
	施工箇所：雨戸 錆止め
	施工箇所：雨戸 中塗り

	施工箇所：雨戸 上塗り
	施工箇所：雨戸 施工後
	施工箇所：シーリング使用材料 プライマー　US-3 1缶 サンスター　2570NB　4缶 （KS　ルナホワイト）

	施工箇所：屋根使用材料 マイルドシーラーEPO1缶 ヤネフレッシュSi2缶（SR102）チェスナットブラウン
	施工箇所：外壁・付帯部使用材料 SDサーフエポ3缶 水性セラミシリコン2缶(SR163) 水性セラミシリコン1缶（SR　413調色） 水性エコファイン1缶（SR163調色） クリーンマイルドシリコン1缶（255） クリーンマイルドシリコン1缶（黒）
	施工箇所：全体 施工後

	施工箇所：全体 施工後
